
Elektro WVA BVBA
Wim Van Acker
Vennenhof 4
9800 Deinze
Gsm: 0477/72.51.80
Fax: 09/383.56.40
www.elektro-wva.be
btw BE 0831.057.891

KLANT: Dhr & Mevr Tempels - De Spiegeleire
H. Consciencestraat 68
9860 Merelbeke

BENAMING	BEVEILIGING	OMSCHRIJVING
A	3P 25A	FORNUIS
B	2P 20A	BOILER
C	2P 20A	STOPC KEUKEN 1
D	2P 20A	STOPC KEUKEN 2
E	2P 20A	CV
F	2P 20A	DROOGKAST
G	2P 20A	WASMACHINE
H	2P 20A	STOPC MASTERBEDROOM
I	2P 20A	OVEN
J	2P 20A	VAATWAS
K	2P 20A	MICROGOLF
L	2P 20A	STOPC LIVING
M	2P 20A	STOPC FRIGO + DAMPKAP
N	2P 20A	TUINHUIS
O	2P 20A	STOPC ZOLDER + SLPK +2 + HAL +2
P	2P 20A	STOPC POMP + AAN KAST
Q	2P 20A	STOPC SLAAPK +1
R	2P 16A	VERL GELIJKVLOERS + BADKAMER
S	2P 16A	VERLICHTING +1 - +2 - +3
T	2P 16A	VENTILATIE
~~U~~	~~2P 16A~~	~~BEL~~
V	4P 30mA 40A	VERLIEESTROOM VOCHTIG
W	4P 300mA 40A	HOOFDVERLIESSTROOM


ELEKTRO WVA
VENNENHOF 4 9800DEINZE
BTWBE0831.057.891
0477/72.51.80
WWW.ELEKTRO-WVA.BE

VINÇOTTE
Stephan HEBBELINCK
Inspecteur
3228
GSM: 0478/S04194

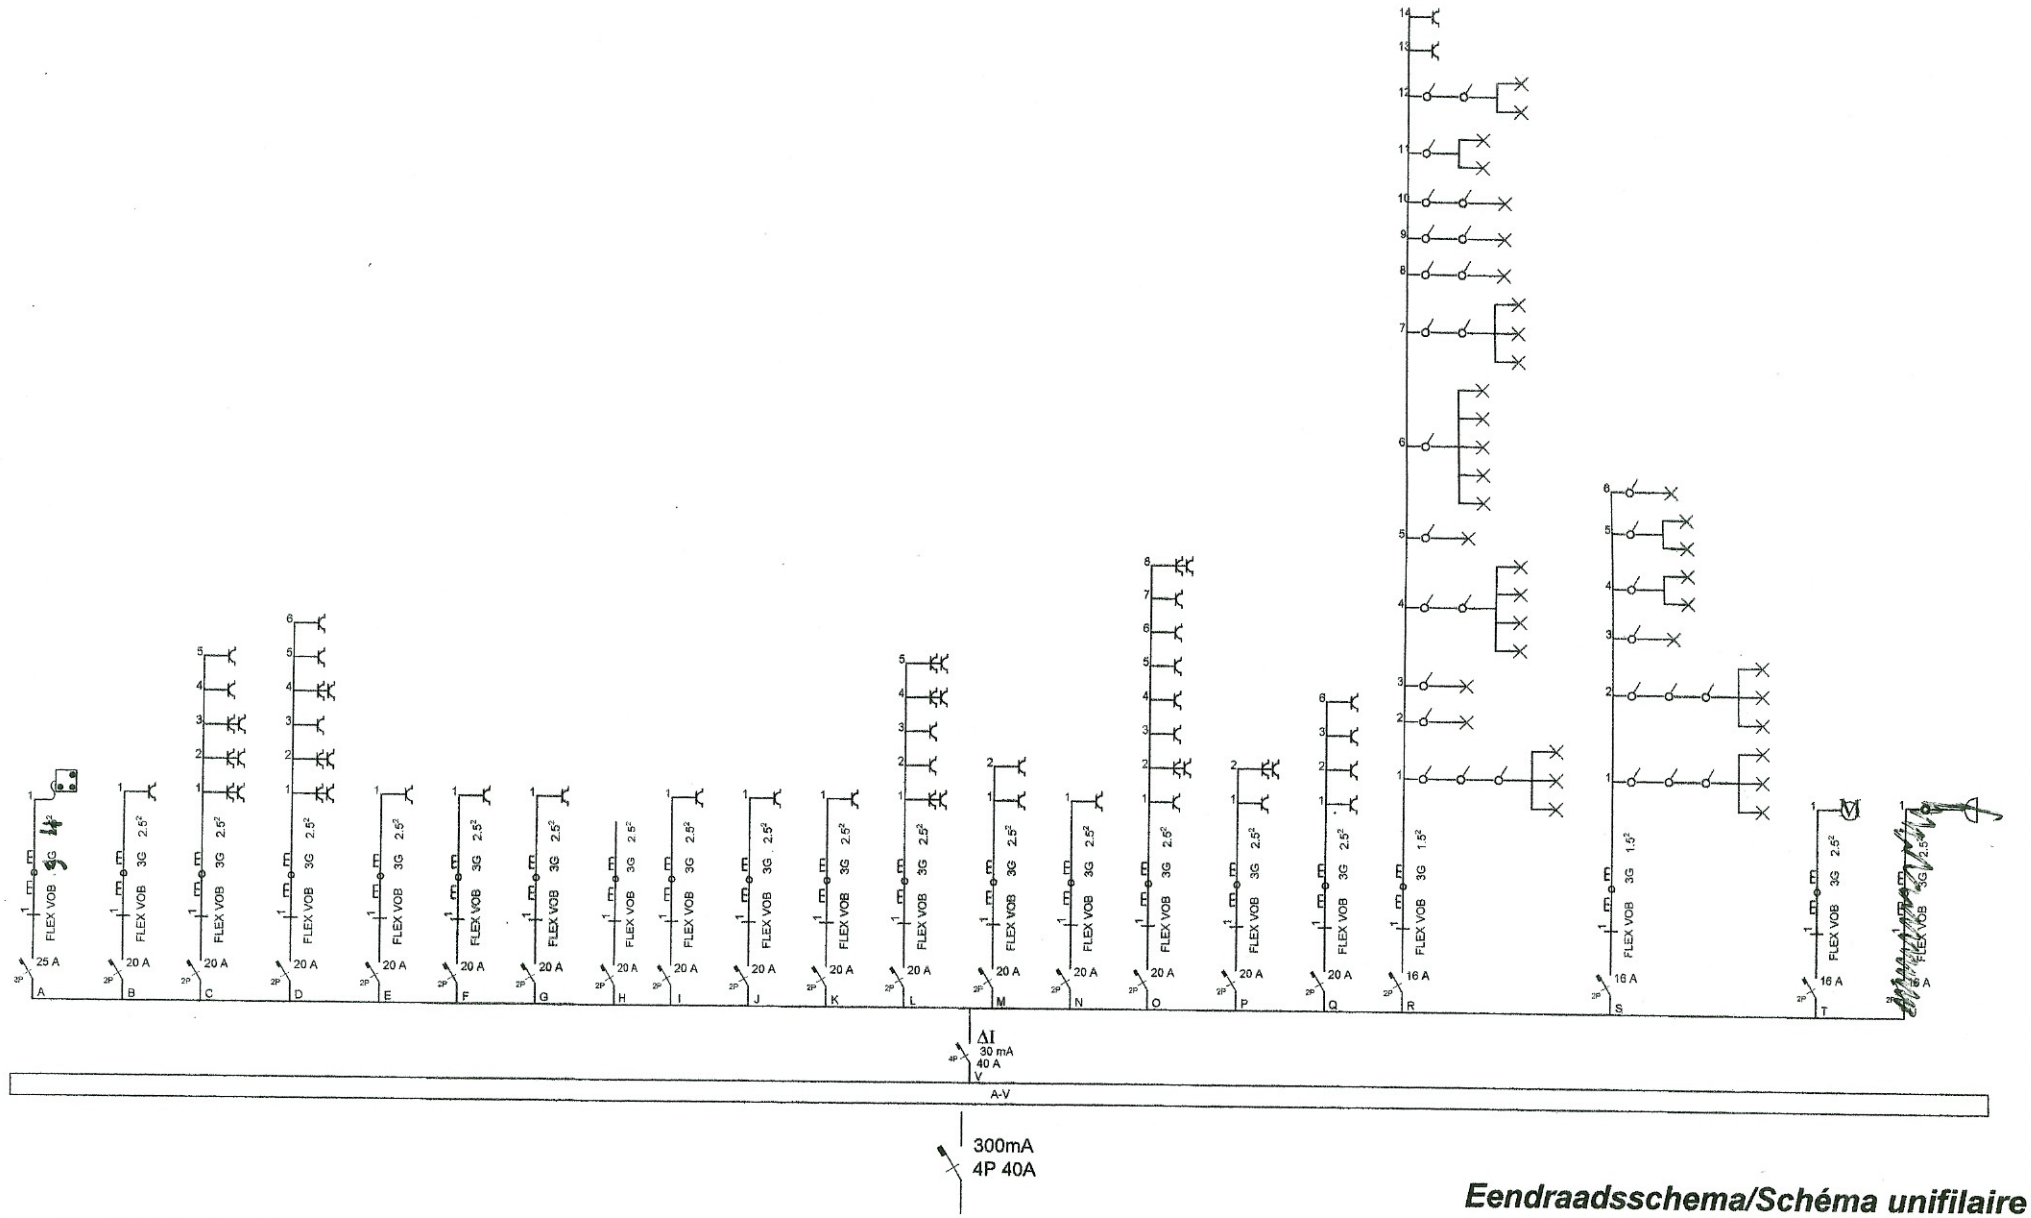


Eendraadsschema/Schéma unifilaire


INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom **Elektro WVA BVBA** BTW / TVA **BE0831.057.891** Datum/Date **24-01-2011** Handtek/Sign	Organisme **SAB Vincotte** Naam/Nom **Stephan Heirbaut** Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom **Tempels - De Spiegeleire** Straat/Rue **H. Consciencestraat 68** Gemeen/Comm **9860 Merelbeke** Handtek/Sign	ELEKTRO WVA VENNENHOF 4 9800 DEINZE 0477/72.51.80

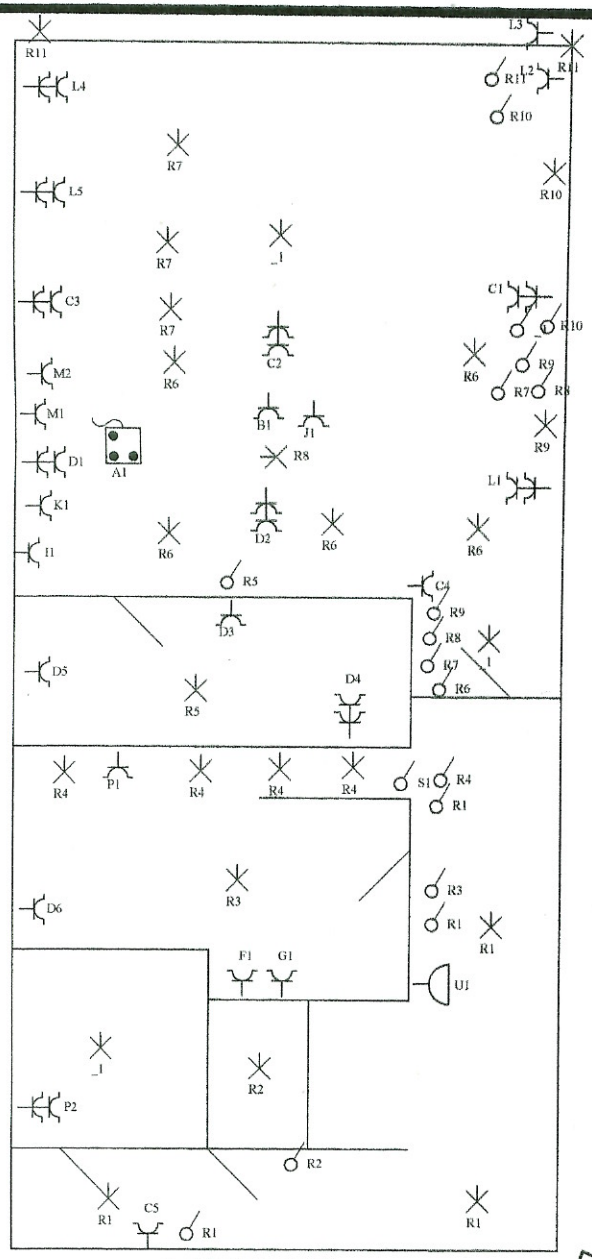

©UGELIJKVLOERS

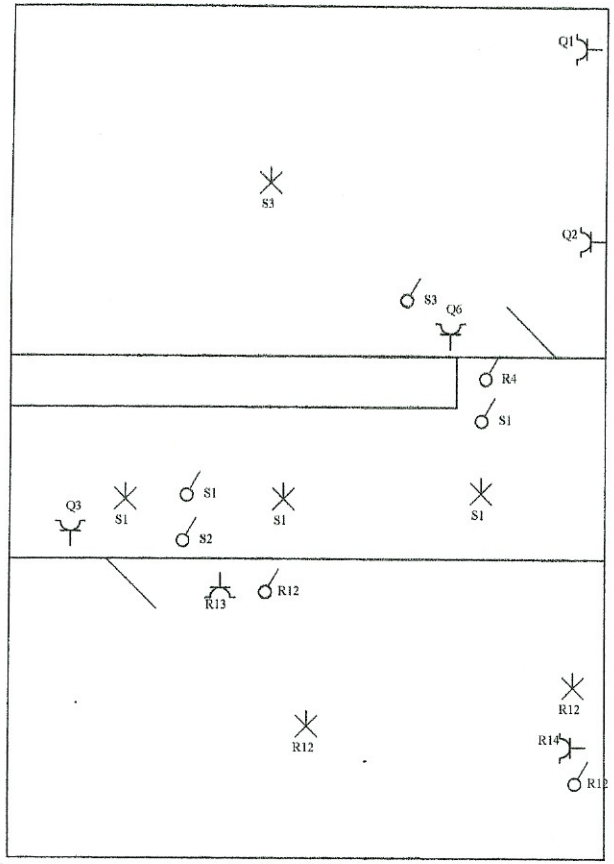

VERDIEP +1

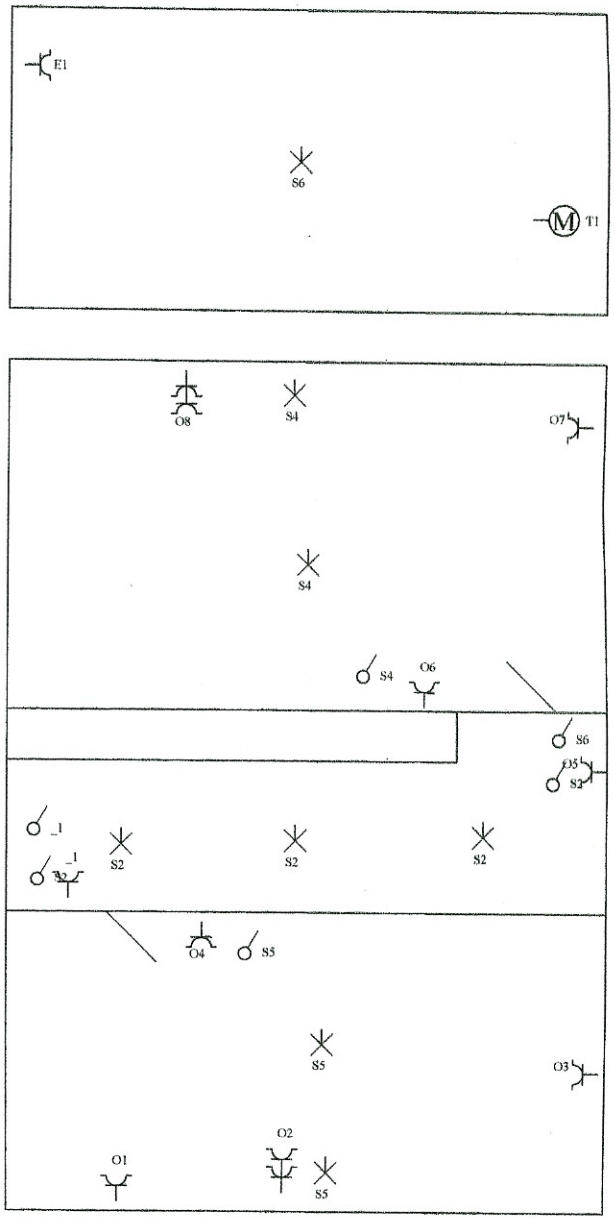

VERDIEPING +2

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom Elektro WVA BVBA BTW / TVA BE0831.057.891 Datum/Date 24-01-2011 Handtek/Sign	Organisme AIB Vinçotte Naam/Nom Stephan Heirbrickx Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Tempels - De Spiegeleire Straat/Rue H. Consciencestraat 68 Gemeen/Comm 9860 Merelbeke Handtek/Sign	**ELEKTRO WVA** BVBA VENNENHOF 4 9800 DEINZE 0477/72.51.80

Stephan HEIRBRICKX
Vinçotte
GSM: 0478/804194

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

Erkend Controleorganisme

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

www.btvcontrol.be

Regionaal kantoor

U. ref.: _____

O. ref.: _____ VERSLAG Nr.: 2/10 1103/08

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN EEN BINNENINSTALLATIE AARDGAS

☐ bij indienststelling
☒ periodiek

Plaats van onderzoek : H. CONSCIENCESTRAAT 6 & MELSBEKE

EIGENAAR : TEMPELS SVEN - DE SPIEGELAERE 3.

Adres : H. CONSCIENCESTRAAT 6 - MELSBEKE

OPDRACHTGEVER: DEZUTTERE BVBA

Adres : NIEUWMARKTSTRAAT 9 - EVERGEM

INSTALLATEUR : DEZUTTERE BVBA

Adres : _____

BTW of IK nr.: _____

Datum van onderzoek : _____

Aanwezige personen: _____

DNB : _____

Gebruiker van de installatie: _____

1. ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN: Teller: Klasse: G6 Nr.: 7098626 Index [m³]: 38 cdo 1 $P_{max.\ teller}$ [mbar]: 200

Hoogst toelaatbare bedrijfsdruk(ken) (PMSA,PMS,MOP) [mbar]: 20 Installatie: ☐ nieuw ☐ bestaande ☒ uitbreiding ☐ gedeelte van een installatie

☒ Beschrijving: zie schema in bijlage

Leidingen en toebehoren (diameter, materiaal, omvang, locatie, kranen, stoppen, drukregelaars, ...): _____

Toestellen (merk/model, type, nominaal vermogen [kW], serienummer, locatie, omschrijving afvoerkanaal, ...): _____

WOLF - C33x - 23,1kW

2. ONDERZOEK: Volgens de actuele staat van de onderzochte aardgas binneninstallatie(gedeelten) en voor zover het visueel onderzoek mogelijk is:

2.1. ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek aan de norm(en) NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002 die van toepassing zijn op de onderzochte installatie(gedeelten) (materiaal, aanleg, uitvoering, verluchting, afvoer, ...), volgens werkinstructie 10Id013 en onderzoek volgens 2.2.

2.2. ☒ Dichtheidsproef volgens werkinstructie 10Id012 en volgens volgende beproeving(en):

			NBN D51-003	NBN D51-004 (ingegraven of DN >50 mm of PSMA>100 mbar tot 15 bar)				
		drukcategorie en beproevingsmiddel	L.D. ☐ Lucht ☐ Inert gas	L.D. ☐ Lucht ☐ Inert gas	M.D.A. ☐ Lucht ☐ Inert gas	M.D.B. ☐ Lucht ☐ Inert gas	M.D.C. BUITEN ☐ Lucht ☐ Inert gas	M.D.C. BINNEN Water
BIJ INDIENSTSTELLING	LEIDING	I. aanvankelijke dichtheidscontrole afzepen + manometer (1)	/	/	1 bar ☐ (2) ☐ (4)	1 bar ☐ (3) ☐ (4)	1 bar ☐ (3) ☐ (4)	/
		II. mechanische weerstandsproef	/	/	5 bar tijd > 15 min. ☐ (2) ☐ (4)	5 bar tijd > 15 min. ☐ (3) ☐ (4)	1,1 x PMS tijd > 15 min. ☐ (3) ☐ (4)	1,33 x PMS tijd > 60 min.
	BINNEN-INSTALLATIE	III. (uiteindelijke) dichtheidsproef afzepen + manometer (1)	☐ 100 mbar	☐ PMS en 100 mbar	PMS en 100 mbar ☐ (2) ☐ (4)	PMS en 100 mbar ☐ (3) ☐ (4)	PMS en 100 mbar ☐ Lucht ☐ Inert gas ☐ (3) ☐ (4)	
		IV. niet-destructieve proef (vóór punt 2.2.I.)	/	/	/	☐ Indien in bijzonder bestek ☐ (3) ☐ (*)	Bemonstering: 10% van de lassen; minimum 3 lassen per lasser per bouwplaats; minimum 1 las per lasser ☐ (3) ☐ (*)	
PERIODIEK		Binneninstallatie: dichtheidsproef: afzepen + ☐ manometer ☐ gasmeter klasse G4 of G6	☒ Aardgas op werkdruk (1)	☐ Aardgas op werkdruk (1)	☐ Aardgas op werkdruk (1)	☐ Aardgas op werkdruk (1)	☐ Aardgas op werkdruk (1)	

(1) gedurende de tijd nodig voor het afzepen van de bereikbare delen (fittings, lassen, kranen, toebehoren enz...) i.f.v. de omvang van de installatie en omstandigheden met een minimum van 10 minuten. (2) In bijlage: een voorgaand BTV verslag. (*) In bijlage: uitbesteding. (3) In bijlage: het bewijs van de CE-markering en de EG-verklaring, van de leidingen DN >25mm (richtlijn drukapparatuur 97/23/EG, K.B. 13/06/1999, vanaf 29/05/2002). (4) voor ons onderzoek werd de druk geplaatst door de opdrachtgever/installateur

3. VASTSTELLINGEN ~~EN/OF NOTA'S~~: geen.

nota: 1. tijdelijk deel tussen B en C niet meer dichtbaar.
2 tijdelijk deel tussen C en D: geen wand geplaatst, hou rekening met keuringen i.v.m. pers koppelingen

4. BESLUIT:

☒ A. Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte installatie **conform** is en het onderzoek volgens **punt 2.2 voldoening** heeft geschonken.
☐ B. Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte installatie **niet conform** is, aan de vaststellingen is nog te voldoen.
☐ C. Het onderzoek, volgens **punt 2.2.**, heeft **voldoening** geschonken.
☐ D. Het onderzoek, volgens **punt 2.2.**, heeft **geen voldoening** geschonken, aan de vaststellingen is nog te voldoen.

5. MEDEDELINGEN EN PLICHTEN: zie verso

Bijlagen: ☐ Voorgaand BTV verslag nrs ☐ Uitbesteding ☐ Installatieschema ☐ Bewijs CE-markering, EG-verklaring van de leidingen DN>25 mm op M.D.B., M.D.C. (richtlijn drukapparatuur 97/23/EG)

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)

Ondertekend voor gelezen en geïnformeerd, (naam, handtekening)

voor De Directeur,

vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : T32284801/Ge

BELAC 040-INSP N 147685

Resi code: 1

○ Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 ☒ Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
○ Brabant tel.: 02 674 57 11 ○ Wallonië tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam,voornaam : ..... w.v.A.	Naam, voornaam : Tempels	
Ident. Kaart nr. :	Adres : H. Consciencestraat 68	
BTW nr.: BE 0831 057 831	Post nr. + Stad : 3960 Heusden	
	Tel. : . . . /	. . . / . . . . .

Basis van het onderzoek : *Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)* ○ .....

☒ Art 270	☒ ingebruikname	○ wijziging	○ uitbreiding	☒ Art 86	○ Art 271 bis	☒ **Wooneenheid**
	○ mobiel	○ tijdelijk		○ Art 87	○ Art 278	② **Huishoudelijke werkeenheid**
○ Art 271	○ periodiek	○ controle	○	○ Art 88	○ Art	③ **Gemeenschappelijke delen**
○ Art 276 : verzwaring		○ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid		○ Art ...	○ Art	④ **Werkeenheid**

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	○ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht :	○ kWh excl. nacht meter :	
	Bescherming aansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 ○40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	nr. : ..... meterstand :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ○ 230 V ☒ 3x230 V ○ 3N400 V ○.....	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ○32 ☒40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	○ aardingslus ☒ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : 3 X 16 mm² - Type : E.x.v.B	○	
Beschrijving installatie ☒ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA	Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 20
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☒ Toestellen	☒ Materieel	☒ T>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 2.6 Ω	○ Algemeen isolatieniveau : + 1 MΩ	☒ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		

Differentieelstroominrichting : ○ was verzegeld ☒ werd verzegeld ○ werd niet verzegeld ○ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☒ **Nihil**	.....
Inbreuken Bestaande installatie ○ **Nihil**	.....
Opmerkingen ○ **Nihil**	enkel kast geplaatst aan electra w.v.A. zelf niet gezien door eigenaar

Visum DNB of aangestelde : gezien op 17/02/11 Eandis

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie (voldoet) ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
○ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 26/1/2026 (*)
○ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : H. Hebbelinck S. Agent nr. 3243 Datum : 26/1/2011

Voor de directeur generaal : Handtekening

Stephan HEBBELINCK Inspecteur VINCOTTE GSM: 0478/804194

Bijlage(n) : ○ Situatieschema('s) : 1 ○ Eéndraadsschema('s) : 1 ○ .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

A 0395312

GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB) VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971

Ondergetekende : Naam :...DELUTTERE.....Voornaam :..BART.....
Vertegenwoordiger van de onderneming :..DELUTTERE...BVBA..... B.T.W. nr:.....
Straat :...NACHTEGAALSTRAAT.....Nr. :..9.....Bus :.....
Postcode:...9990.....Gemeente :..EVERGEM.....Tel:.....Fax:.....
(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma:.....
Adres + tel:.....)
bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie
nieuwe installatie / ~~**nieuw gedeelte van installatie**~~ (het onnodige schrappen) volgens het plan hierna
in het gebouw gelegen te :Straat :...H. CONSCIENCELAAN.....Nr. :..68...Bus :.....Verdieping:.....
Postcode nr :..9820.....Gemeente :..MERELBEKE.....
Gasmeter merk: SCHLUMBERGER gasmeter nummer: 0 7 0 9 8 6 2 6
voor rekening van : Naam :..TEMPELS-DE SPIEGELAERE.....Voornaam :.....
Straat :...H. CONSCIENCELAAN.....Nr.:..68.....Bus :.....
Postcode :..9820.....Gemeente :..MERELBEKE.....
te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normen NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001en NBN B61-002. Deze normen hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Voorbehouden aan de installateur:	**Voorbehouden aan de DNB:**
Ik verklaar dat ik een "Cerga–professionele gasinstallateur" ben ☐ ja ☐ neen indien ja: Cerga nr:	....


Datum:..23/.12./.2019..
.
Handtekening

Model 710628/10

Bijlage(n) .....

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B,..., het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).
Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

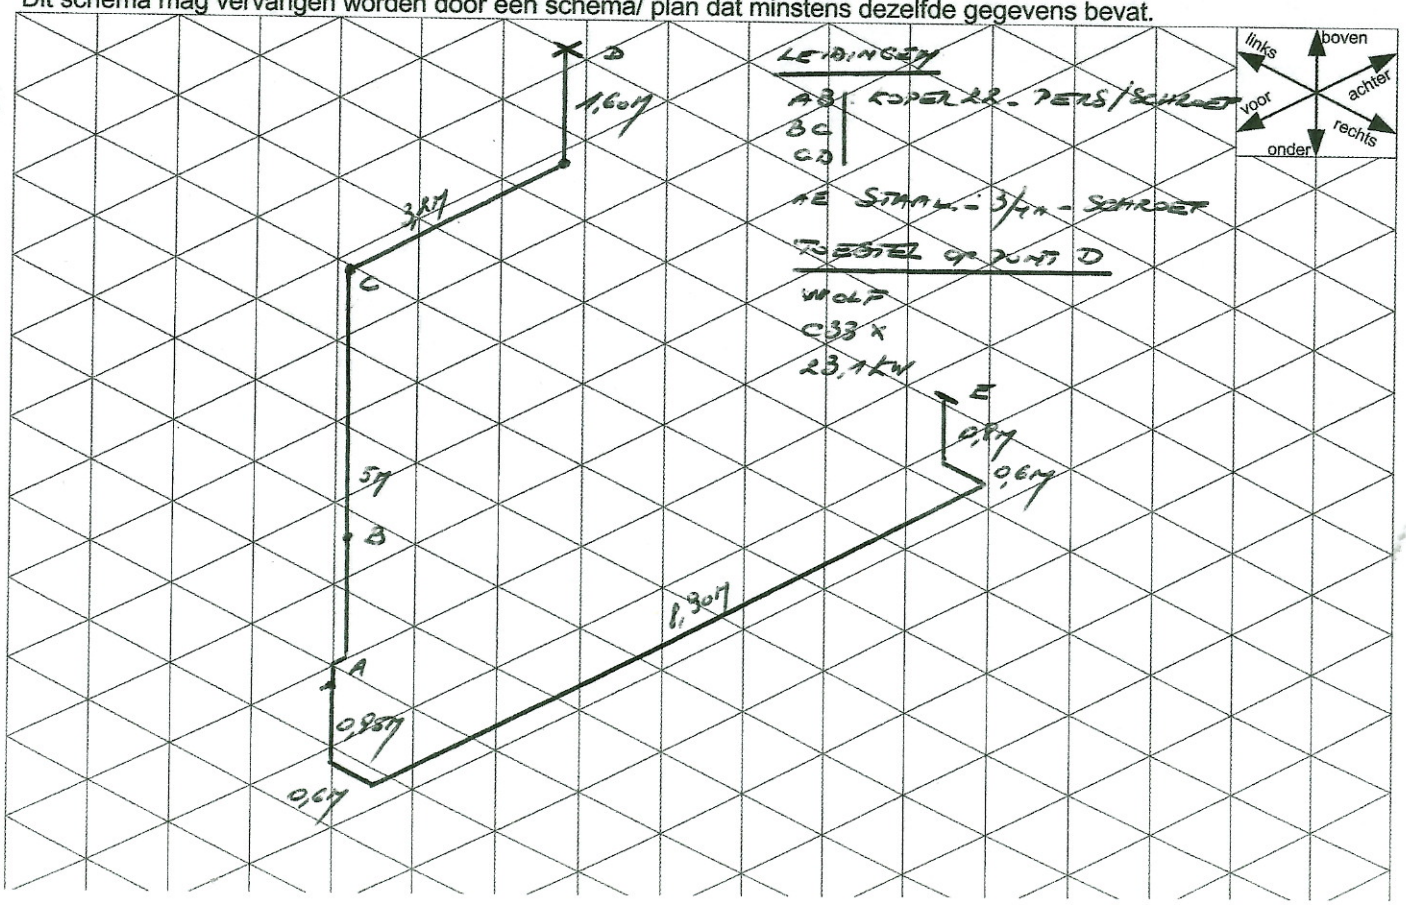

Wit: DNB – Roze: Kant – Groen: Controleorganisme – Geel: Installateur
